




PNRR – Progetti Edilizia Scolastica

Stato avanzamento al 30 giugno 2024

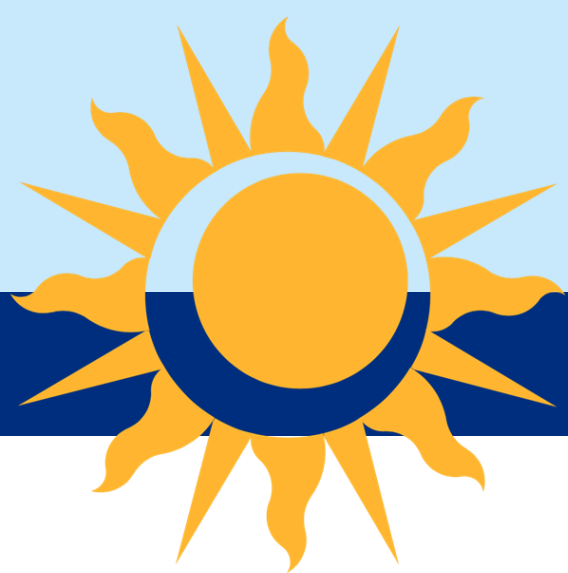

Le opere PNRR finanziate

Progetti	Quota PNRR	Co-finanziamento	Fondo Opere Indifferibili	Totale costo opere
36	126.335.225,30 €	4.652.282,90 €	7.779.190,72 €	138.766.698,94 €

ORIGINE FONTI DI FINANZIAMENTO

Fonti di finanziamenti	N. Opere	Importo complessivo opere
Progetti «in essere»	26	88.551.538,94 €
Progetto FUTURA	10	50.215.160,00 €
Totale	36	138.766.698,94 €

M2.C3.I.1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica

La misura mira a realizzare nuovi edifici scolastici per garantire agli studenti e alle studentesse di frequentare scuole moderne, verdi e sicure, dimezzando il consumo di energia e abbattendo le emissioni annue di gas a effetto serra.

Ultima milestone: avvio lavori entro il 30/11/2023

Comune	Istituto	Lavoro	Importo opera
Milano	Frise	Sostituzione e ricostruzione nuova scuola	26.400.000,00 €




M4C1I1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense


La misura mira a potenziare le infrastrutture dedicate ai servizi per la mensa attraverso la costruzione di nuove mense ovvero la riqualificazione di quelle esistenti in modo da superare uno storico divario esistente tra il nord e il sud del Paese e favorire l'attivazione del tempo pieno ovvero l'incremento del tempo scuola.

Ultima milestone: avvio lavori entro il 30/11/2023

Comune	Istituto	Lavoro	Importo opera
Milano	Educando Setti Carraro	Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della «Mensa»	545.300,0

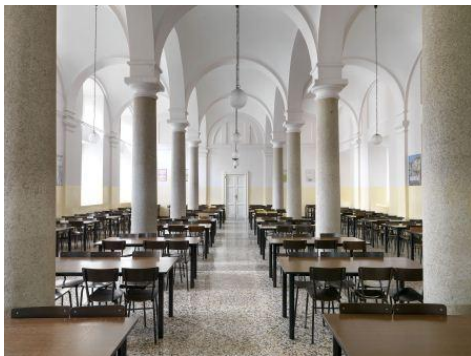

Lavori sono al 40%,
la fine è prevista per fine 2024.

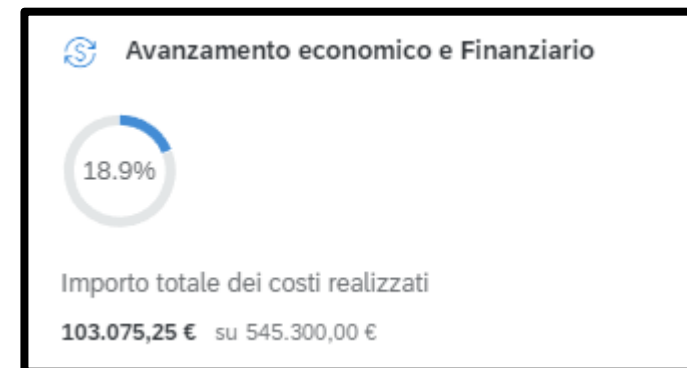

M4C1I1.3. Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

La misura intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie a nuova realizzazione o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti

Ultima milestone: consegna lavori entro il 30 marzo 2024

Comune	Istituto	Lavoro	Importo opera
Milano	IIS E. Mattei – IIS Piero della Francesca - LS-LCP.Levi	RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELLE PALESTRE	1.620.000,00 €

Lavori appena avviati



M4C1I3.3. Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

La misura intende **rendere gli edifici** pubblici adibiti a scuole del primo e secondo ciclo di istruzione **innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi, con interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e sostituzione edilizia.**


Ultima milestone: avvio lavori entro il 30/11/2023

Fonti di finanziamenti	N. Opere	Importo complessivo opere
Progetti «in essere»	26	88.551.538,94 €
Progetto FUTURA	7	21.649.860,00 €
Totale	33	110.201.398,94

Per 12 opere i lavori sono terminati per un totale di 12.657.000,00 €

Comune	Istituto	Lavoro	Importo opera
Legnano	Dell'Acqua	Recupero palestra	300.000,00 €
Legnano	Bernocchi	Serramenti	2.632.000,00 €
Legnano	Bernocchi	Torneria	210.000,00 €
Parabiago	Maggiolini	Coperture e blocchi bagni delle palestre	210.000,00 €
Rho	Rebora	Ristrutturazione spazi didattici	1.650.000,00 €
Milano	Frisi	Messa in sicurezza	650.000,00 €
Milano	Galilei- Tito Livio	Sistemazione aule	700.000,00 €
Milano	Kandinsky	Serramenti e ripristino facciata	1.700.000,00 €
Milano	Vespucci	Rifacimento coperture	1.500.000,00 €
Milano	Educandato Setti Carraro	Rifacimento coperture	1.755.000,00 €
Arese	Falcone-Borsellino	Coperture e impianti elettrici	600.000,00 €
Paderno Dugnano	Gadda	Infissi e risanamento ambientale	750.000,00 €

Alcune immagini dei lavori realizzati

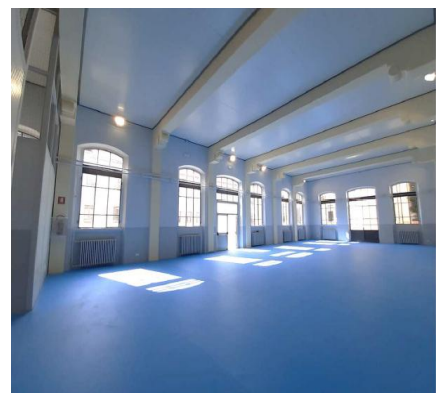

Dell'Acqua di Legnano – recupero palestra



Bernocchi di Legnano – torneria



Olmo di Cornaredo – efficientamento energetico



Vespucci di Milano – rifacimento coperture



Falcone Borsellino di Arese – Coperture e impianti elettrici



Galilei di Milano
Recupero laboratori e rifacimento coperture



Gadda di Paderno Dugnano
Infissi e risanamento ambientale



Rebora di Rho – Ristrutturazione spazi didattici

Progetti con stato avanzamento lavori avanzato

Comune	Istituto	Lavoro	Stato lavori	Importo opera
Cernusco sul Naviglio	IPSIA Majorana	Miglioramento sismico	Fine prev. 30/09/2024	4.561.700,00 €
Rho	Rebora	Adeguamento normativo	Fine prev. 11/09/2024	700.000,00 €
Milano	Verri	Serramenti	Fine prev. 31/12/2024	2.197.041,71 €
Cassano d'Adda	Giordano Bruno	Nuova palestra	Fine prev. 31/12/2024	2.350.000,00 €
Rho	Rebora	Nuova palestra	50 % lavori eseguiti	2.350.000,00 €
Arese	Russell	Nuovo corpo aule	38 % lavori eseguiti	2.510.250,77 €
Legnano	Bernocchi	Adeguamento normativo	60 % lavori eseguiti	10.384.000,00 €
Milano	Pareto	Adeguamento sismico + efficientamento energetico	60% lavori eseguiti	7.803.000,00 €
Milano	Russell	Nuove aule e Aula Magna	35 % lavori eseguiti	2.200.000,00 €
Tutti	Diversi istituti	Manutenzione straordinaria	50 % lavori eseguiti	9.619.920,00 €
Tutti	Diversi istituti	Efficientamento energetico	35 % lavori eseguiti	2.200.000,00 €

Alcune immagini dei lavori



Bernocchi di Legnano
adeguamento normativo



Curie Sraffa di Milano
sostituzione ascensori, montascale




Rebora di Rho –
Nuova palestra



Russell di Arese –
Nuovo corpo aule



Pareto di Milano
Adeguamento sismico + efficientamento energetico

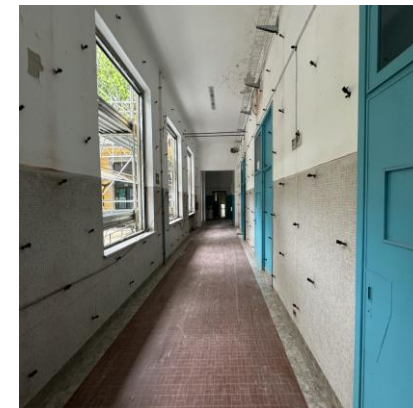

Progetti con lavori avviati

Comune	Istituto	Lavoro	% stato avanzamento lavori	Importo opera
Tutti	Tutti	Manutenzione straordinaria servizi igienici	Lavori avviati	6.718.427,10 €
Milano	Feltrinelli	Capannoni e laboratori	Lavori avviati	3.800.000,00 €
Tutti	Tutti	Manutenzione straordinaria impianti di riscaldamento/ventilazione	Fase approv. progetto	1.500.000,00 €

Appalto integrati – (progettazione/lavori)

Comune	Istituto	Lavoro	Stato avanzamento lavori	Importo opera
Milano	Giorgi	Lavori di ampliamento	Avviati lavori	14.456.559,53 €
Milano	Vespucci	Nuovo corpo aule e palestra	Fase approv. progetto	11.184.823,38 €
Milano	CS Puecher	Aree all'aperto per attività sportiva	Fase approv. progetto	930.000,00 €
Milano	Leonardo da Vinci	Riqualificazione energetica dell'involucro trasparente	Fase approv. progetto	816.860,00 €
Milano	Schiapparelli - Gramsci	Miglioramento strutturale ed efficientamento energetico	Fase approv. progetto	2.400.000,00 €
Milano	Vittorio Veneto	Riqualificazione energetica dell'involucro opaco	Avviato lavori	5.000.000,00 €
Tutti	tutti	Impianti tecnologici	Fase approv. progetto	4.022.067,22 €
